

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
1		**Xestión dun Ximnasio**	**57,75 days**	**1/1/27, 8:00**	**29/3/27, 10:00**
2		**Xestión**	**57,75 days**	**1/1/27, 8:00**	**29/3/27, 10:00**
3		Seguimento e decisións	57,75 days	4/1/27, 8:00	29/3/27, 10:00
4		Alcance e requisitos	3 days	1/1/27, 8:00	6/1/27, 17:00
5		Elaborar o plan do proxecto	2 days	7/1/27, 8:00	8/1/27, 17:00
6		Fito 1: Plan e alcance aprobados	0 days	8/1/27, 17:00	8/1/27, 17:00
7		**Diseño preeliminar**	**5 days**	**11/1/27, 8:00**	**15/1/27, 17:00**
8		Deseño lóxico da BD (MER, MR...)	4 days	11/1/27, 8:00	14/1/27, 17:00
9		Deseño base da aplicación	0,5 days	15/1/27, 8:00	15/1/27, 13:00
10		Documentación inicial do deseño	0,5 days	15/1/27, 13:00	15/1/27, 17:00
11		Fito 2: Deseño preeliminar completo	0 days	15/1/27, 17:00	15/1/27, 17:00
12		**Incremento 1: Accesos e usuarios**	**24 days**	**18/1/27, 8:00**	**23/2/27, 13:00**
13		**Deseño I1**	**1 day**	**18/1/27, 8:00**	**19/1/27, 10:00**
14		Deseño das interfaces de acceso e usuarios	0,5 days	18/1/27, 8:00	18/1/27, 13:00
15		Documentación do deseño da I1	0,5 days	18/1/27, 13:00	19/1/27, 10:00
16		Fito 3.1: Deseño I1 completo	0 days	19/1/27, 10:00	19/1/27, 10:00
17		**Desenvolvemento I1**	**13 days**	**19/1/27, 10:00**	**9/2/27, 13:00**
18		Creación da BD en SQL	2 days	19/1/27, 10:00	21/1/27, 15:00
19		Implementación das interfaces I1 (Swing)	2 days	22/1/27, 8:00	26/1/27, 13:00
20		Implementación da seguridade	2 days	26/1/27, 13:00	29/1/27, 10:00
21		Implementación Módulo acceso (T1)	2 days	29/1/27, 10:00	2/2/27, 13:00
22		Implementación Módulo usuarios (T2, T3, T6, T12)	5 days	2/2/27, 13:00	9/2/27, 13:00
23		Fito 3.2: Implementación I1 completa	0 days	9/2/27, 13:00	9/2/27, 13:00
24		**Integración I1**	**3 days**	**9/2/27, 13:00**	**12/2/27, 13:00**
25		Concectar BD con JDBC	2 days	9/2/27, 13:00	11/2/27, 13:00
26		Unificación módulos I1	1 day	11/2/27, 13:00	12/2/27, 13:00
27		Fito 3.3: I1 integrada	0 days	12/2/27, 13:00	12/2/27, 13:00
28		**Probas I1**	**4 days**	**12/2/27, 13:00**	**18/2/27, 13:00**
29		Comprobar conexión JDBC e SQL	1 day	12/2/27, 13:00	15/2/27, 13:00
30		Realización probas de seguridade e de integridade dos datos	2 days	15/2/27, 13:00	17/2/27, 13:00
31		Probas funcionais I1	1 day	17/2/27, 13:00	18/2/27, 13:00
32		Fito 3.4: Probas I1 completas	0 days	18/2/27, 13:00	18/2/27, 13:00
33		**Documentación I1**	**2 days**	**18/2/27, 13:00**	**22/2/27, 13:00**
34		Actualización da memoria de deseño	0,5 days	18/2/27, 13:00	18/2/27, 17:00

Predecesores	Nombres del Recurso	Costo	Trabajo
		6497,56 €	**486,9 horas**
		2313,19 €	**100,9 horas**
	Director/a[15 %]	1689,19 €	69,3 horas
	Diseñador/a-Analista[75 ...	292,50 €	18 horas
4	Director/a[85 %]	331,50 €	13,6 horas
5		0,00 €	0 horas
		487,50 €	**30 horas**
6	Diseñador/a-Analista[75 ...	390,00 €	24 horas
8	Diseñador/a-Analista[75 ...	48,75 €	3 horas
9	Diseñador/a-Analista[75 ...	48,75 €	3 horas
10		0,00 €	0 horas
		1798,06 €	**181,1 horas**
		97,50 €	**6 horas**
11	Diseñador/a-Analista[75 ...	48,75 €	3 horas
14	Diseñador/a-Analista[75 ...	48,75 €	3 horas
15		0,00 €	0 horas
		845,00 €	**104 horas**
16	Programador/a	130,00 €	16 horas
18	Programador/a	130,00 €	16 horas
19	Programador/a	130,00 €	16 horas
20	Programador/a	130,00 €	16 horas
21	Programador/a	325,00 €	40 horas
22		0,00 €	0 horas
		195,00 €	**24 horas**
23	Programador/a	130,00 €	16 horas
25	Programador/a	65,00 €	8 horas
26		0,00 €	0 horas
		325,00 €	**28 horas**
27	Programador/a	65,00 €	8 horas
29	Diseñador/a-Analista[75 ...	195,00 €	12 horas
30	Programador/a	65,00 €	8 horas
31		0,00 €	0 horas
		195,00 €	**12 horas**
32	Diseñador/a-Analista[75 ...	48,75 €	3 horas

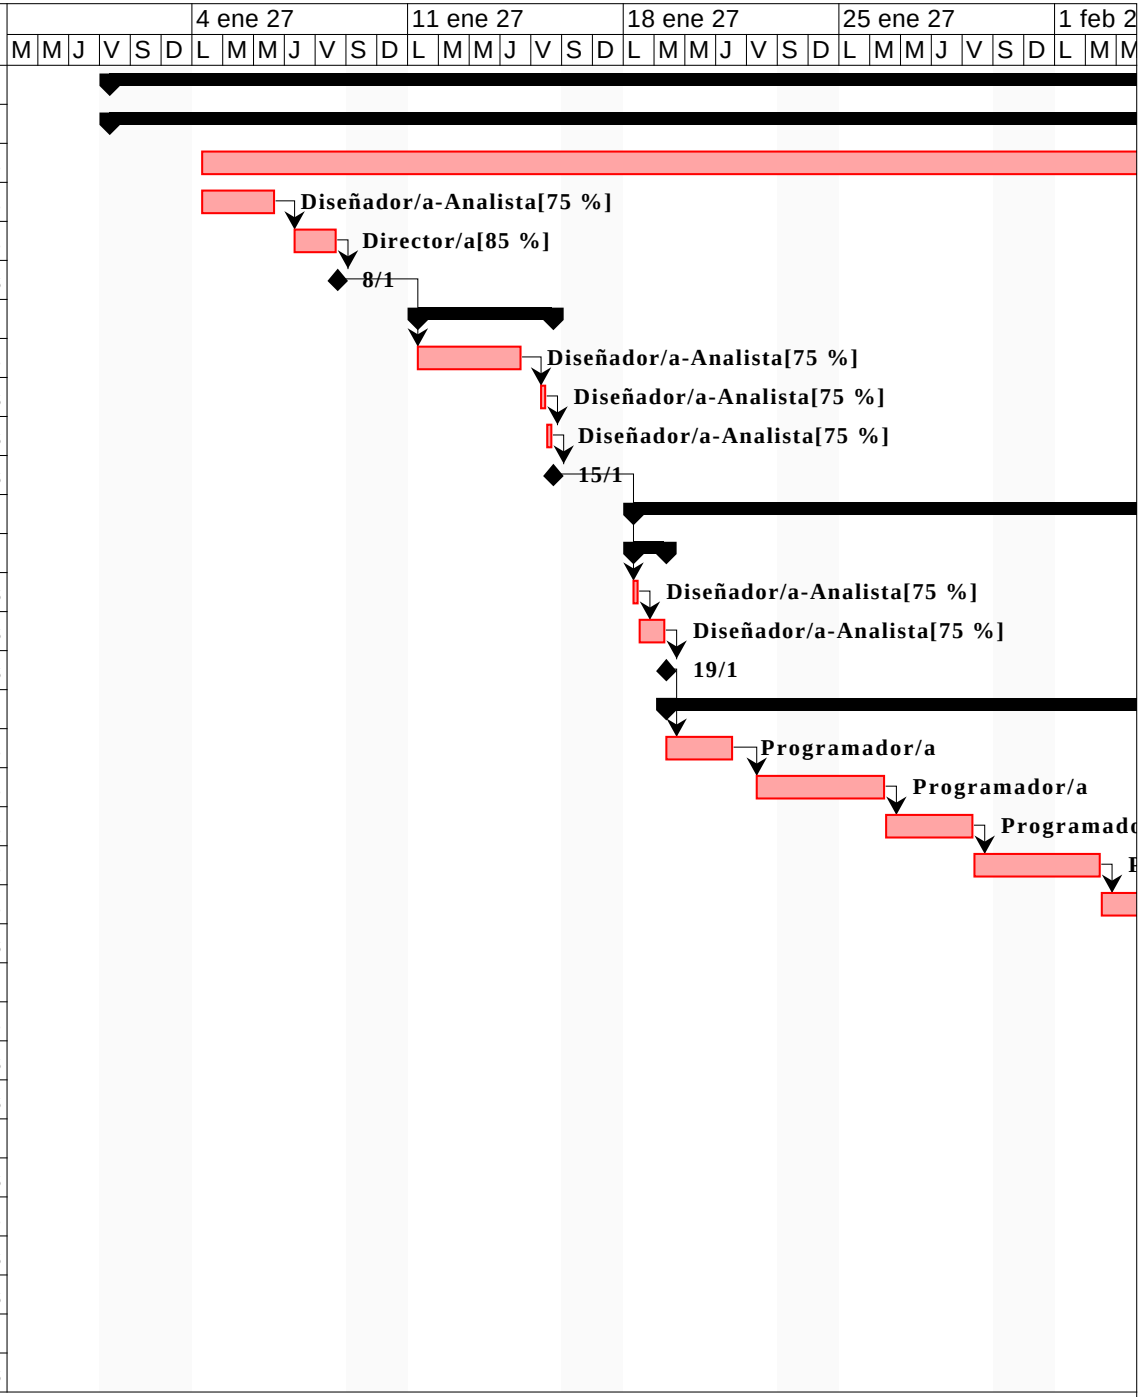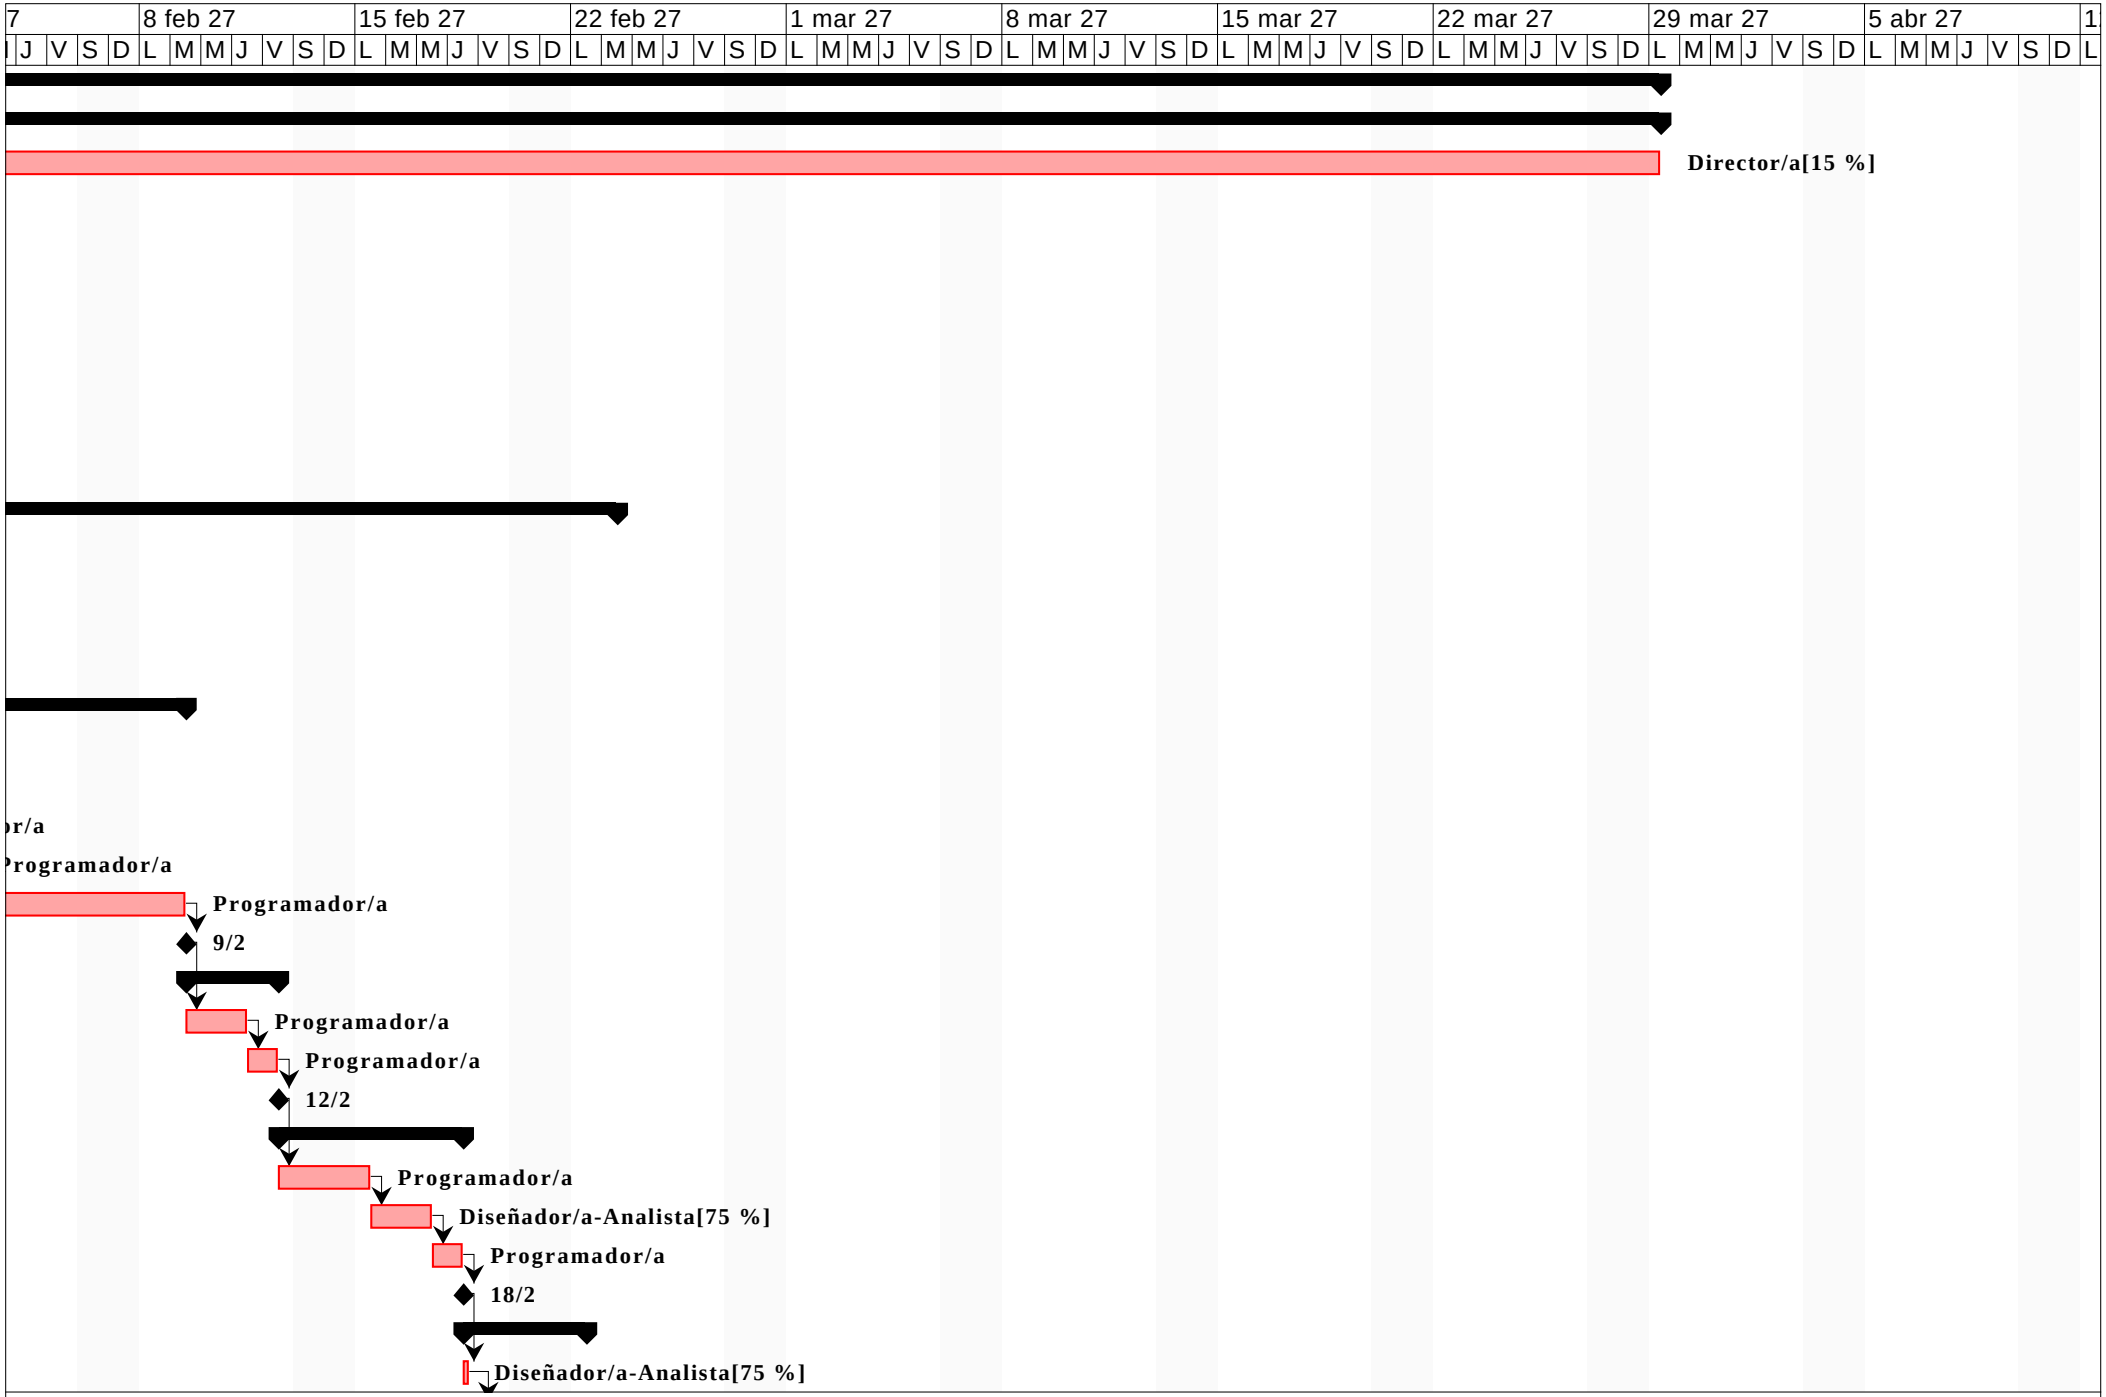




7
8 feb 27
15 feb 27
22 feb 27
1 mar 27
8 mar 27
15 mar 27
22 mar 27
29 mar 27
5 abr 27
1
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
Director/a[15 %]
or/a
Programador/a
Programador/a
9/2
Programador/a
Programador/a
12/2
Programador/a
Diseñador/a-Analista[75 %]
Programador/a
18/2
Diseñador/a-Analista[75 %]

2 abr 27							19 abr 27							26 abr 2		
	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
35		Redacción da memoria de implementación	1,5 days	19/2/27, 8:00	22/2/27, 13:00
36		Fito 3.5: Documentación I1 completa	0 days	22/2/27, 13:00	22/2/27, 13:00
37		**Implantación I1**	**1 day**	**22/2/27, 13:00**	**23/2/27, 13:00**
38		Creación do executable I1	0,25 days	22/2/27, 13:00	22/2/27, 15:00
39		Entrega I1	0,25 days	22/2/27, 15:00	22/2/27, 17:00
40		Reunión co cliente	0,5 days	23/2/27, 8:00	23/2/27, 13:00
41		Fito 3: I1 entregada	0 days	23/2/27, 13:00	23/2/27, 13:00
42		**Incremento 2: Inventario**	**12 days**	**23/2/27, 13:00**	**11/3/27, 13:00**
43		**Diseño I2**	**1 day**	**23/2/27, 13:00**	**24/2/27, 13:00**
44		Deseño das interfaces de inventario	0,5 days	23/2/27, 13:00	23/2/27, 17:00
45		Documentación deseño inventario	0,5 days	24/2/27, 8:00	24/2/27, 13:00
46		Fito 4.1: Deseño I2 completo	0 days	24/2/27, 13:00	24/2/27, 13:00
47		**Desenvolvemento I2**	**5 days**	**24/2/27, 13:00**	**3/3/27, 13:00**
48		Implementación Interfaces I2 (Swing)	1 day	24/2/27, 13:00	25/2/27, 13:00
49		Implmentación Módulo Inventario (T13-T15)	4 days	25/2/27, 13:00	3/3/27, 13:00
50		Fito 4.2: Implementación I2 completa	0 days	3/3/27, 13:00	3/3/27, 13:00
51		**Integración I2**	**1 day**	**3/3/27, 13:00**	**4/3/27, 13:00**
52		Unificación módulos I2	0,5 days	3/3/27, 13:00	3/3/27, 17:00
53		Fito 4.3: I2 integrada	0,5 days	4/3/27, 8:00	4/3/27, 13:00
54		**Probas I2**	**2 days**	**4/3/27, 13:00**	**8/3/27, 13:00**
55		Probas funcionais I2	1,5 days	4/3/27, 13:00	5/3/27, 17:00
56		Probas de regresión de I1	0,5 days	8/3/27, 8:00	8/3/27, 13:00
57		Fito 4.4: Probas I2 completas	0 days	8/3/27, 13:00	8/3/27, 13:00
58		**Documentación I2**	**2 days**	**8/3/27, 13:00**	**10/3/27, 13:00**
59		Actualización memoria de deseño I2	0,5 days	8/3/27, 13:00	8/3/27, 17:00
60		Redacción memoria de implementación I2	1,5 days	9/3/27, 8:00	10/3/27, 13:00
61		Fito 4.5: Documentación I2 completa	0 days	10/3/27, 13:00	10/3/27, 13:00
62		**Implantación I2**	**1 day**	**10/3/27, 13:00**	**11/3/27, 13:00**
63		Creación do executable I2	0,25 days	10/3/27, 13:00	10/3/27, 15:00
64		Entrega I2	0,25 days	10/3/27, 15:00	10/3/27, 17:00
65		Reunión co cliente	0,5 days	11/3/27, 8:00	11/3/27, 13:00
66		Fito 4: Entrega I2	0 days	11/3/27, 13:00	11/3/27, 13:00
67		**Incremento 3: Limpeza**	**11 days**	**11/3/27, 13:00**	**26/3/27, 13:00**
68		**Deseño I3**	**1 day**	**11/3/27, 13:00**	**12/3/27, 13:00**

Predecesores	Nombres del Recurso	Costo	Trabajo
34	Diseñador/a-Analista[75 ...	146,25 €	9 horas
35		0,00 €	0 horas
		140,56 €	**7,1 horas**
36	Programador/a	16,25 €	2 horas
38	Director/a[85 %]	41,44 €	1,7 horas
39	Director/a[85 %]	82,88 €	3,4 horas
40		0,00 €	0 horas
		920,56 €	**89,1 horas**
		97,50 €	**6 horas**
41	Diseñador/a-Analista[75 ...	48,75 €	3 horas
44	Diseñador/a-Analista[75 ...	48,75 €	3 horas
45		0,00 €	0 horas
		325,00 €	**40 horas**
46	Programador/a	65,00 €	8 horas
48	Programador/a	260,00 €	32 horas
49		0,00 €	0 horas
		32,50 €	**8 horas**
50	Programador/a	32,50 €	4 horas
52		0,00 €	4 horas
		130,00 €	**16 horas**
53	Programador/a	97,50 €	12 horas
55	Programador/a	32,50 €	4 horas
56		0,00 €	0 horas
		195,00 €	**12 horas**
57	Diseñador/a-Analista[75 ...	48,75 €	3 horas
59	Diseñador/a-Analista[75 ...	146,25 €	9 horas
60		0,00 €	0 horas
		140,56 €	**7,1 horas**
61	Programador/a	16,25 €	2 horas
63	Director/a[85 %]	41,44 €	1,7 horas
64	Director/a[85 %]	82,88 €	3,4 horas
65		0,00 €	0 horas
		888,06 €	**81,1 horas**
		97,50 €	**6 horas**




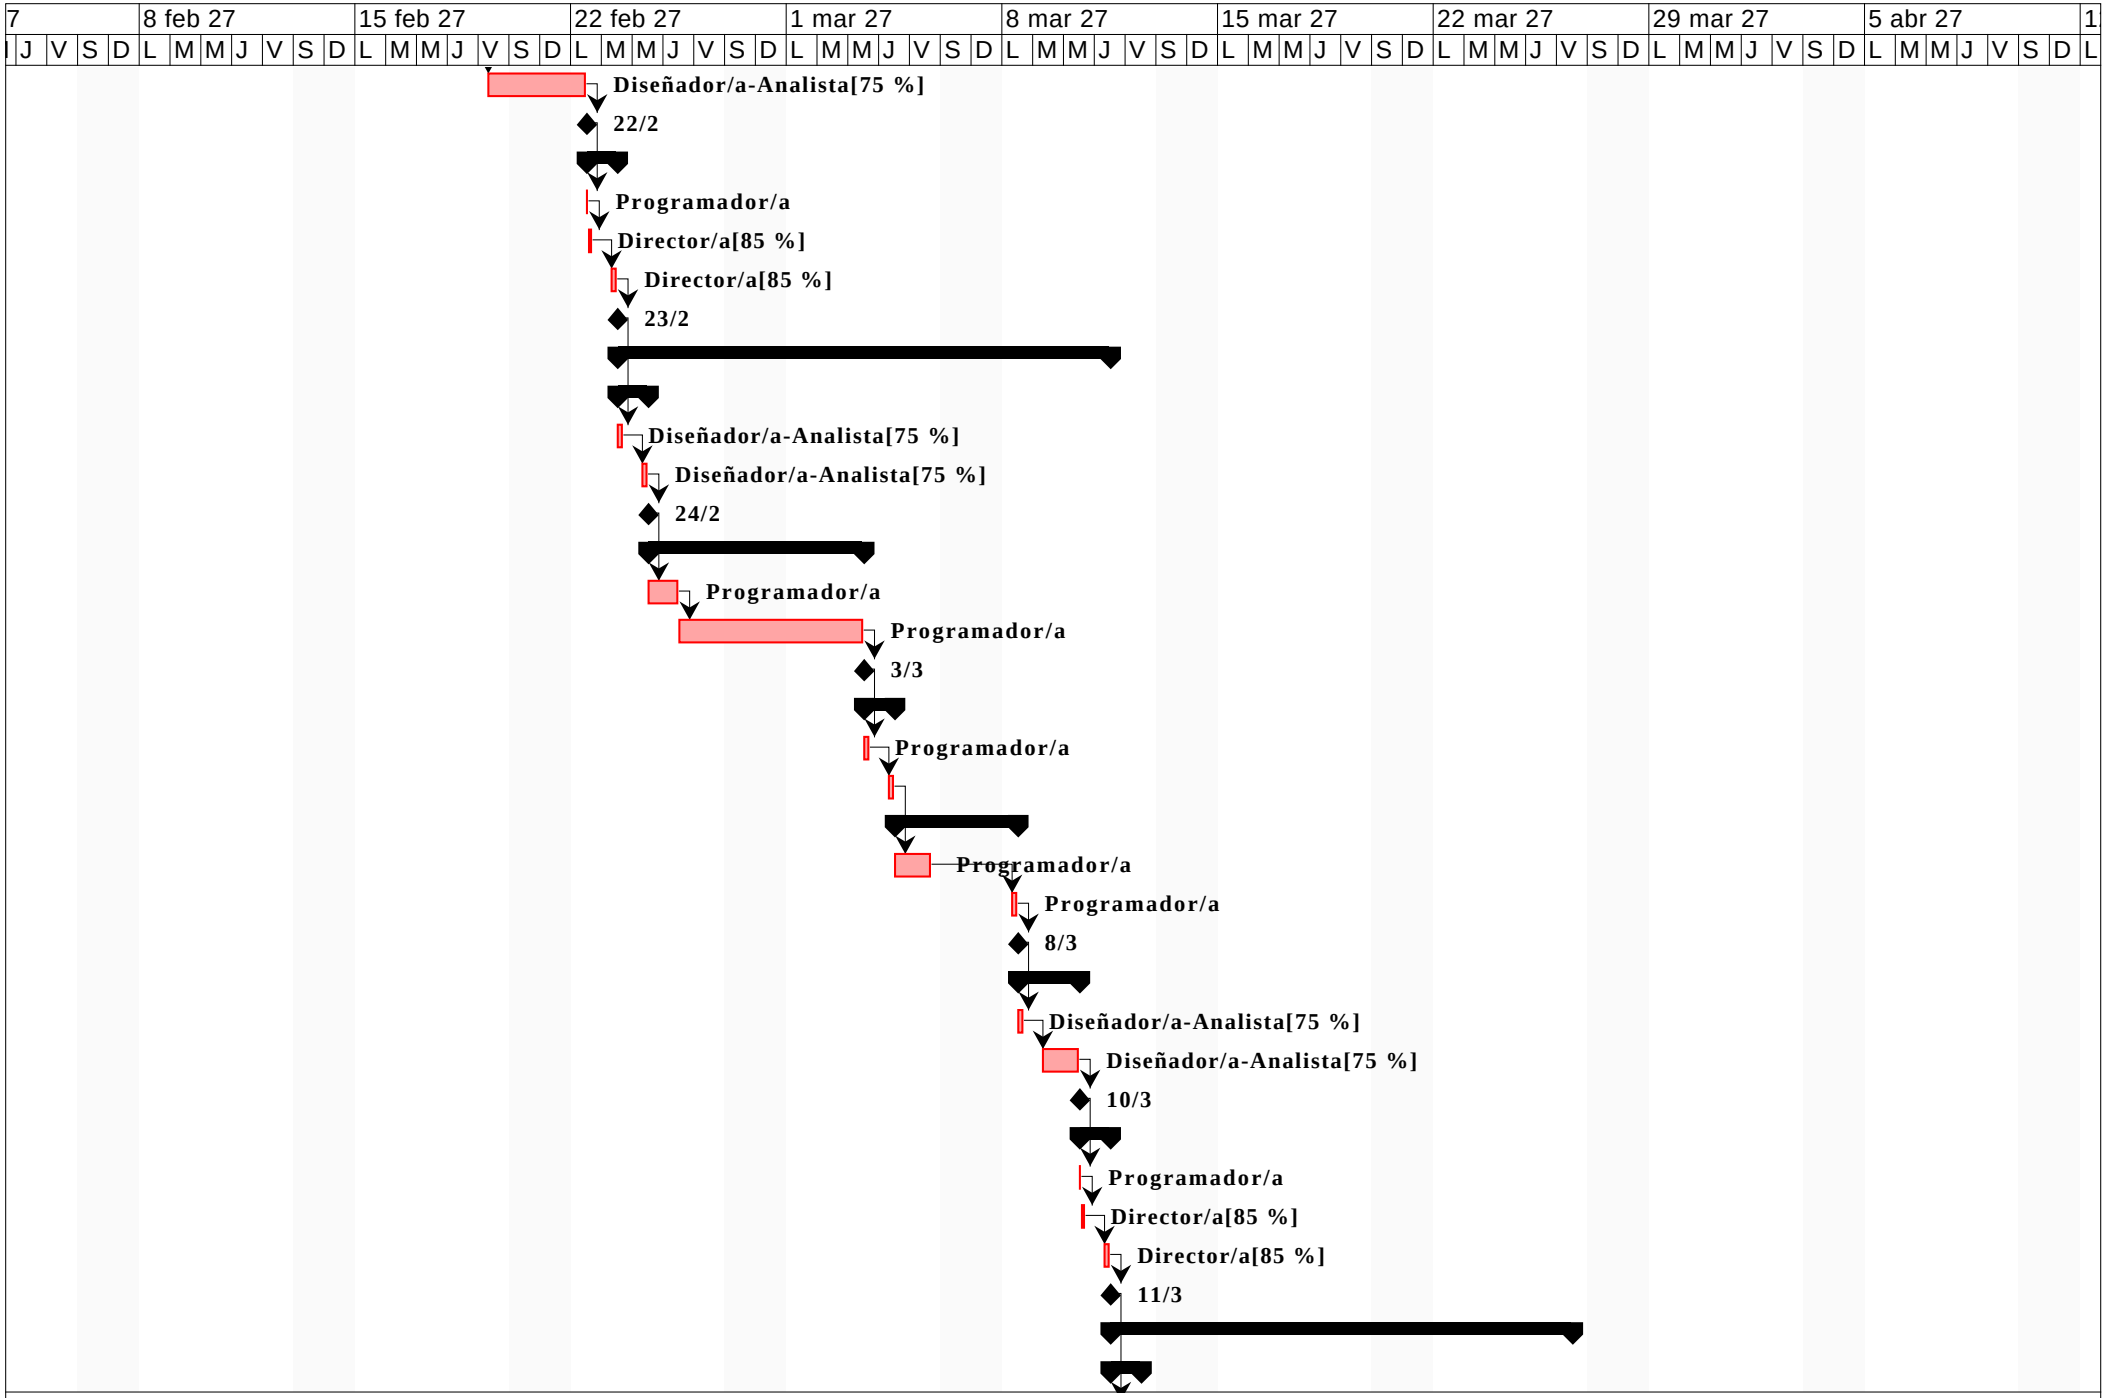

7
8 feb 27
15 feb 27
22 feb 27
1 mar 27
8 mar 27
15 mar 27
22 mar 27
29 mar 27
5 abr 27
Diseñador/a-Analista[75 %]
22/2
Programador/a
Director/a[85 %]
Director/a[85 %]
23/2
Diseñador/a-Analista[75 %]
Diseñador/a-Analista[75 %]
24/2
Programador/a
Programador/a
3/3
Programador/a
Programador/a
Programador/a
8/3
Diseñador/a-Analista[75 %]
Diseñador/a-Analista[75 %]
10/3
Programador/a
Director/a[85 %]
Director/a[85 %]
11/3

2 abr 27							19 abr 27							26 abr 2		
	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
69		Deseño das interfaces de I3	0,5 days	11/3/27, 13:00	11/3/27, 17:00
70		Documentacion do deseño de I3	0,5 days	12/3/27, 8:00	12/3/27, 13:00
71		Fito 5.1: Documentación I3 completa	0 days	12/3/27, 13:00	12/3/27, 13:00
72		**Desenvolvemento I3**	**4 days**	**12/3/27, 13:00**	**18/3/27, 13:00**
73		Implementación das interfaces I3 (Swing)	1 day	12/3/27, 13:00	15/3/27, 13:00
74		Implementación Módulo limpeza (T16)	3 days	15/3/27, 13:00	18/3/27, 13:00
75		Fito 5.2: Implementación I3 completa	0 days	18/3/27, 13:00	18/3/27, 13:00
76		**Integración I3**	**1 day**	**18/3/27, 13:00**	**19/3/27, 13:00**
77		Unificación de módulos I3	1 day	18/3/27, 13:00	19/3/27, 13:00
78		Fito 5.3: I3 integrada	0 days	19/3/27, 13:00	19/3/27, 13:00
79		**Probas I3**	**2 days**	**19/3/27, 13:00**	**23/3/27, 13:00**
80		Probas funcionais para I3	1,5 days	19/3/27, 13:00	22/3/27, 17:00
81		Realización probas de regresión de I2 e I1	0,5 days	23/3/27, 8:00	23/3/27, 13:00
82		Fito 5.4: Probas I3 completas	0 days	23/3/27, 13:00	23/3/27, 13:00
83		**Documentación I3**	**2 days**	**23/3/27, 13:00**	**25/3/27, 13:00**
84		Actualización de memoria de deseño de I3	0,5 days	23/3/27, 13:00	23/3/27, 17:00
85		Redacción memoria de implementación I3	1,5 days	24/3/27, 8:00	25/3/27, 13:00
86		Fito 5.5: Documentación I3 completa	0 days	25/3/27, 13:00	25/3/27, 13:00
87		**Implantación I3**	**1 day**	**25/3/27, 13:00**	**26/3/27, 13:00**
88		Creación do executable para I3	0,25 days	25/3/27, 13:00	25/3/27, 15:00
89		Entrega de I3	0,25 days	25/3/27, 15:00	25/3/27, 17:00
90		Reunión co cliente	0,5 days	26/3/27, 8:00	26/3/27, 13:00
91		Fito 5: Entrega I3 completa	0 days	26/3/27, 13:00	26/3/27, 13:00
92		**Entrega final e peche**	**0,75 days**	**26/3/27, 13:00**	**29/3/27, 10:00**
93		Revisión final do sistema completo	0,5 days	26/3/27, 13:00	26/3/27, 17:00
94		Entrega ao cliente	0,25 days	29/3/27, 8:00	29/3/27, 10:00
95		Fito 6: Entrega final realizada	0 days	29/3/27, 10:00	29/3/27, 10:00

Predecesores	Nombres del Recurso	Costo	Trabajo
66	Diseñador/a-Analista[75 ...	48,75 €	3 horas
69	Diseñador/a-Analista[75 ...	48,75 €	3 horas
70		0,00 €	0 horas
		260,00 €	**32 horas**
71	Programador/a	65,00 €	8 horas
73	Programador/a	195,00 €	24 horas
74		0,00 €	0 horas
		65,00 €	**8 horas**
75	Programador/a	65,00 €	8 horas
77		0,00 €	0 horas
		130,00 €	**16 horas**
78	Programador/a	97,50 €	12 horas
80	Programador/a	32,50 €	4 horas
81		0,00 €	0 horas
		195,00 €	**12 horas**
82	Diseñador/a-Analista[75 ...	48,75 €	3 horas
84	Diseñador/a-Analista[75 ...	146,25 €	9 horas
85		0,00 €	0 horas
		140,56 €	**7,1 horas**
86	Programador/a	16,25 €	2 horas
88	Director/a[85 %]	41,44 €	1,7 horas
89	Director/a[85 %]	82,88 €	3,4 horas
90		0,00 €	0 horas
		90,19 €	**4,7 horas**
91	Diseñador/a-Analista[75 ...	48,75 €	3 horas
93	Director/a[85 %]	41,44 €	1,7 horas
94		0,00 €	0 horas

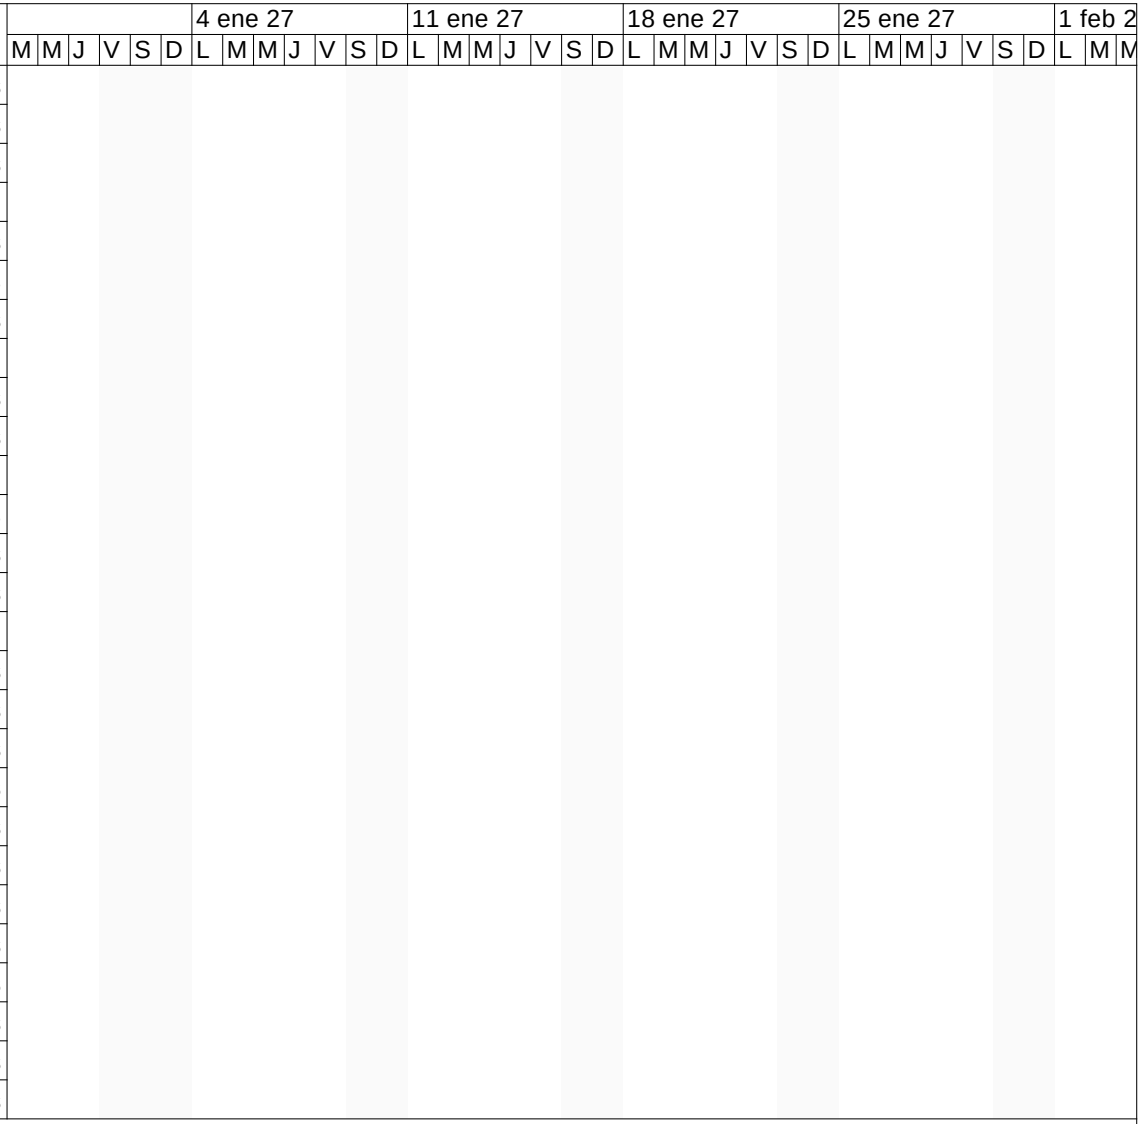

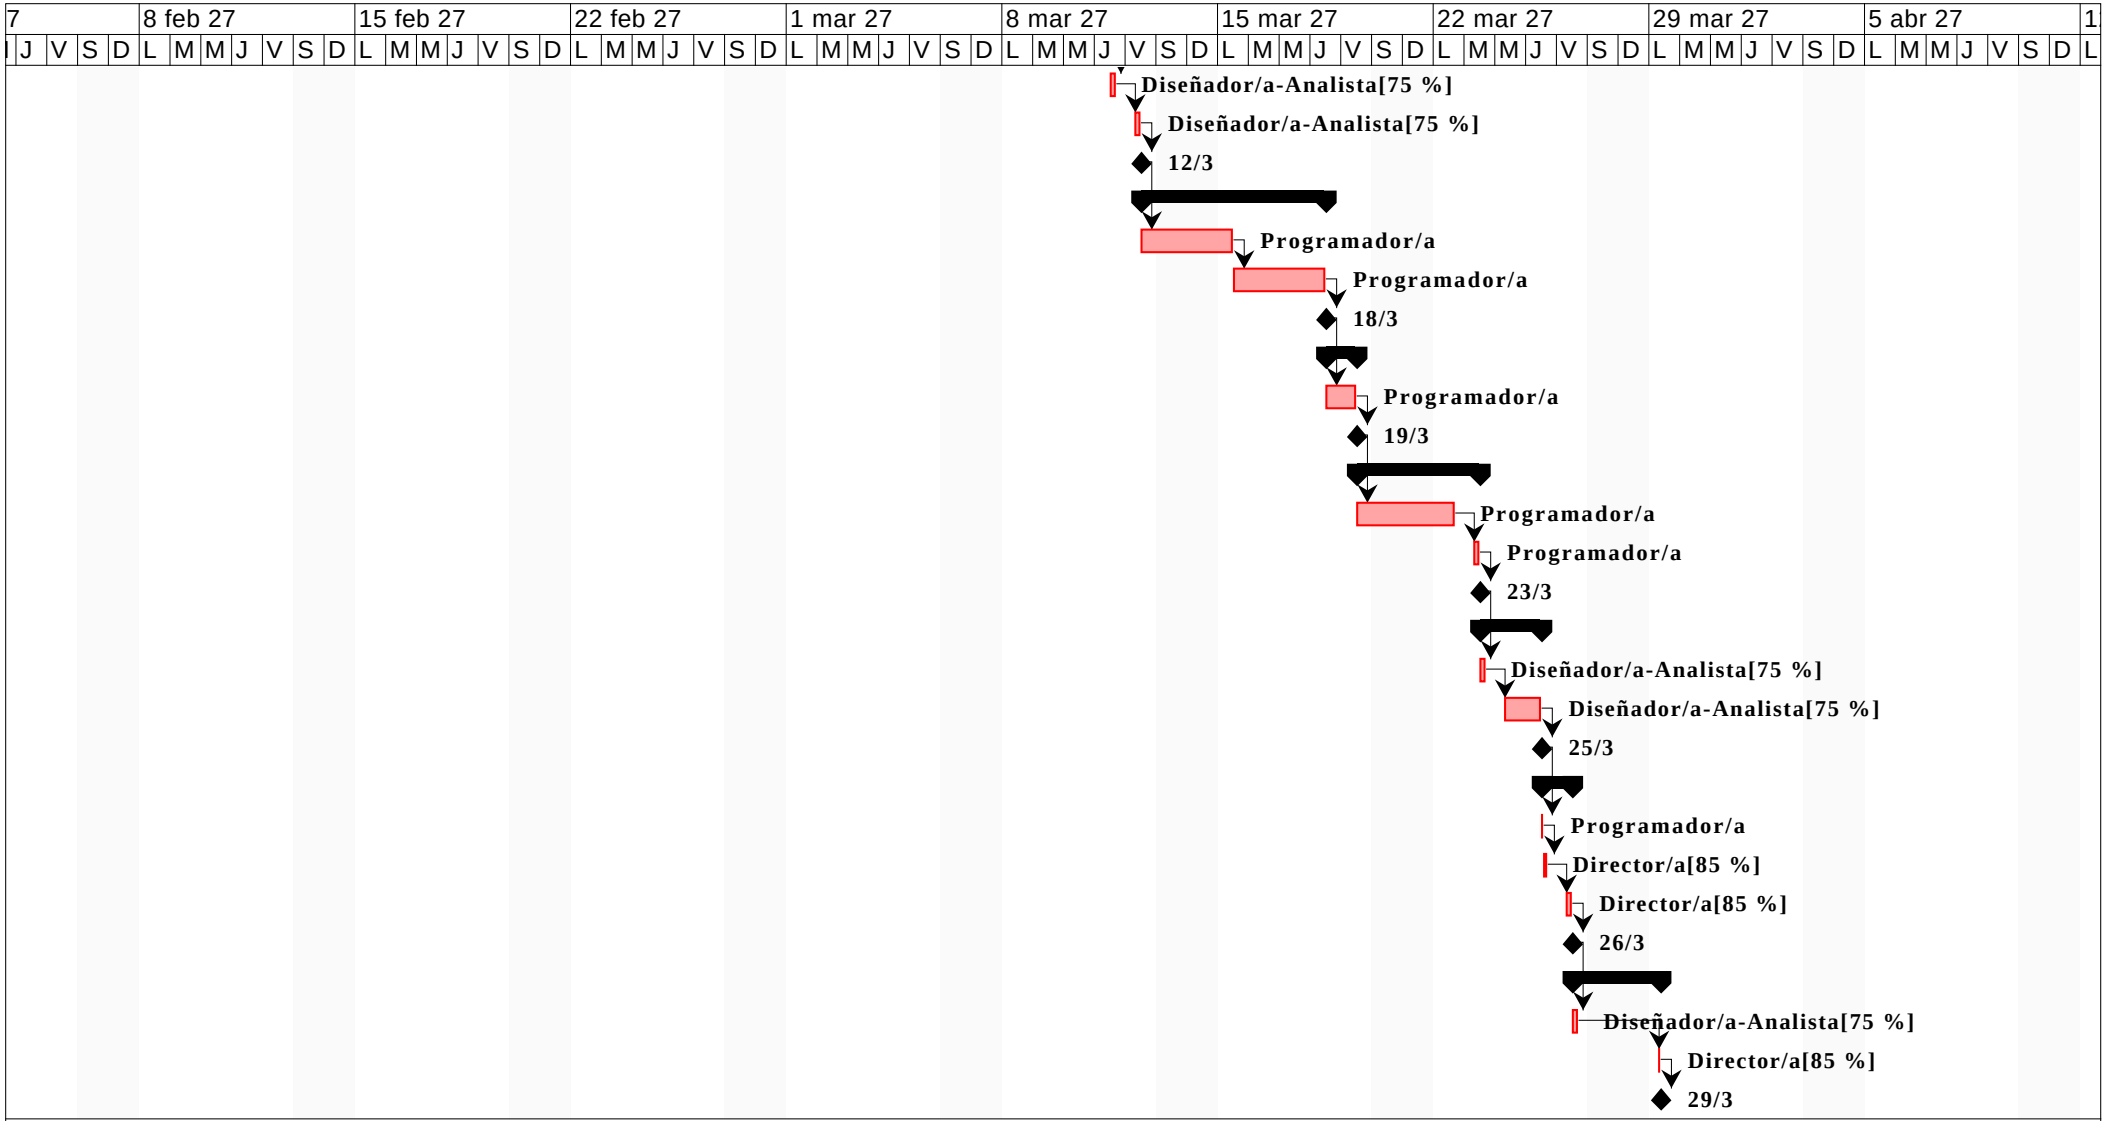
7
8 feb 27
15 feb 27
22 feb 27
1 mar 27
8 mar 27
15 mar 27
22 mar 27
29 mar 27
5 abr 27
1
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
Diseñador/a-Analista[75 %]
Diseñador/a-Analista[75 %]
12/3
Programador/a
Programador/a
18/3
Programador/a
19/3
Programador/a
Programador/a
23/3
Diseñador/a-Analista[75 %]
Diseñador/a-Analista[75 %]
25/3
Programador/a
Director/a[85 %]
Director/a[85 %]
26/3
Diseñador/a-Analista[75 %]
Director/a[85 %]
29/3

2 abr 27							19 abr 27							26 abr 2		
	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
